

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário				Local	Coordenadora
16/07/2025 (João Pessoa/PB)	Início	-	Término	-	Reunião eletrônica	Herminegilda Leite Machado

2. PARTICIPANTES

Nome	Lotação	Cargo
Herminegilda Leite Machado	Presidência	Desa. Presidente do TRT13
Larissa Leônia Bezerra de Andrade Albuquerque	JAP	Juíza Auxiliar da Presidência
Alexandre Gondim Guedes Pereira	GDG	Diretor-Geral da Secretaria
Rodrigo Cartaxo Marques Duarte	SETIC	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação
Rodrigo Cavalcante Barreto	SCR	Diretor da Secretaria da Corregedoria
Luís Fabiano Saldanha Bandeira	AGTIC	Assessor de Governança de TIC
Rodrigo Mafra	AGSI	Assessor de Governança de SI e Proteção de Dados Pessoais
Raimundo José Campos Júnior	Contratos TIC	Responsável pelos Contratos de TIC

3. PAUTA DA REUNIÃO

- Painel de Indicadores de TIC 2025;
- Plano Diretor de Governança de TIC (PDGTIC) 2025/2026;
- Mudanças no plano de ações e projetos do Plano Diretor de TIC 2025/2026;
- Plano de ações e projetos do Plano Diretor de TIC 2025/2026;
- Plano de Contratação e Orçamento de TIC 2025;
- Plano de Capacitação de TIC 2025;
- PROAD n. 3406/2025: criação de módulo/sistema de registro de folgas compensatórias para magistrados;
- Monitoramento das páginas do ranking da transparência para 2026.

4. DISCUSSÃO DA PAUTA

Assunto
Apresentação do Painel de Indicadores de TIC com os dados de 2025. Resumo dos indicadores: • Execução das Ações e Projetos do PDTIC: 59,62% • Execução do Plano de Capacitação de TIC: 29,12% • Orçamento de TIC ◦ Empenhado / Planejado: 92,00% ◦ Liquidado / Empenhado: 25,19% Deliberação do Comitê: sem deliberação.
Atualização do Plano Diretor de Governança de TIC (PDGTIC) 2025/2026. Proposta: • Inclusão do item: Revisão dos processos de elaboração e monitoramento dos contratos e orçamento de TIC; • Exclusão do item: Revisar o Plano de Transformação Digital (PTD). Motivo: CNJ vai usar o PTD da JT elaborado pelo CSJT. Deliberação do Comitê: proposta aprovada conforme apresentada.

Assunto

Atualização das ações e projetos do Plano Diretor de TIC 2025/2026.

Proposta:

- Inclusão dos itens:
 - Classificação Automática de Documentos Administrativos com IA para Conformidade LAI/LGPD no TRT-13;
 - Revisão dos Perfis de Administradores;
 - IgovTIC - acompanhamento e gestão para o biênio;
 - Valorização de TI - definição de planos/normas/ações;
 - Teletrabalho: apoio para definição de ferramentas e métodos para controle de metas;
 - POC solução audiovisual para salas de audiência e sessão;
 - Implantação GLPI.
- Alteração dos itens:
 - Saneamento e migração de informações de pessoal - Etapa 1;
 - Implementar BI de Chamados;
 - [Meu Portal] Módulo de Notificações;
 - Design Systems do TRT-13;
 - Interface para movimentação de patrimônio no SCMP;
 - [Meu Portal] Módulo Pendências e customização de cards;
 - Dashboard de Produtos - Versão 3;
 - Ampliação dos assuntos acessíveis por autoatendimento no SIGEP;
 - [Portal da SETIC] Versão 1.0;
 - Instalação e configuração dos novos roteadores de Internet;
 - Migrar configuração do CDN/WAF para Terraform;
 - Sincronização do AD de HML com o AD de PRD;
 - Flows de rede centralizado;
 - Substituição do Switch Core;
 - POC do JIRA como solução para gerenciamento dos boards das SQUADS (RDM e projetos);
 - Adaptar Catálogo de Serviços ao novo formato de SQUADS;
 - [SQUADS] Estudo das demandas do SIGEP e Folha para minimizar trabalho operacional do N3;
 - [Solução para IRDR] Ideação e Prototipação Visual;
 - Análise de métricas de produtos críticos e definição de gatilhos.
- Exclusão do item:
 - Implantação da nova versão do SCMP.

Deliberação do Comitê: proposta aprovada conforme apresentada.

Atualização dos dados do Plano de Contratação e Orçamento de TIC 2025.

Deliberação do Comitê: plano aprovado conforme apresentado.

Atualização dos dados do Plano de Capacitação de TIC 2025.

Deliberação do Comitê: plano aprovado conforme apresentado.

PROAD n. 3406/2025: criação de módulo/sistema de registro de folgas compensatórias para magistrados:

- Proposta de encaminhamento: ação "Gestão de Banco de Horas de Servidores e Magistrados" prevista no PDTIC para o 4º trimestre de 2025.

Deliberação do Comitê: proposta aprovada conforme apresentada.

Monitoramento das páginas do ranking da transparência para 2026:

- Proposta de encaminhamento: ação "Monitoramento das páginas da prestação de contas e transparência" prevista no PDTIC para o 3º trimestre de 2025.

Deliberação do Comitê: proposta aprovada conforme apresentada.

5. PENDÊNCIAS

6. ANEXOS

- Painel de Indicadores de TIC 2025;
- Plano Diretor de Governança de TIC 2025/2026;
- Mudanças do PDTIC - Ações e Projetos 2025/2026;
- PDTIC - Ações e Projetos 2025/2026;
- PDTIC - Capacitações 2025;
- PDTIC - Contatos e Orçamento 2025;
- PDTIC - Resumo Orçamentário 2025.

7. FECHAMENTO DA ATA - ASSINATURAS

HERMINEGILDA LEITE MACHADO Desembargadora Presidente do TRT-13 Coordenadora	LUÍS FABIANO SALDANHA BANDEIRA Assessor de Governança de TIC Relator
---	--

Indicadores de TIC - 2025

Dados em
formato CSV

Ações e
Projetos

Pessoal


Capacitação

Portfólio de
Soluções

Orçamento

Contratos

iGovTIC-JUD

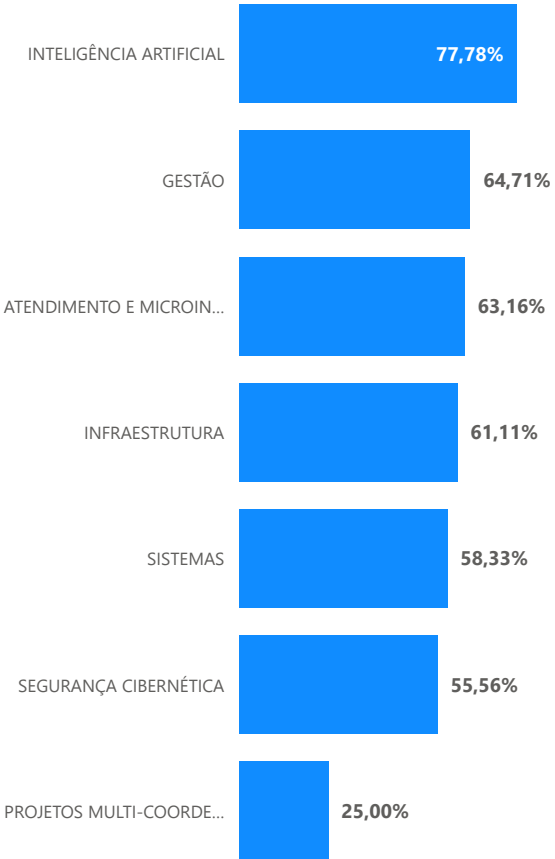

TEMA

Todos

TRIMESTRE

Todos

TIPO

Todos

CONCLUÍDO

Todos

59,62%

Executado

62

Concluído

104

Total

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Ativos Físicos - Organização e Planejamento
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Atualização do ATO TRT GP Nº 355/2015 referente à abertura de chamados de TIC
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Atualização Windows 11
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Capacitação PJe 1º e 2º graus para toda a equipe do DAU
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Consolidação da auditoria de chamados
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Criar rotina de atualização remota periódica de perfis de usuário de estações e notebooks
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Elaboração do manual/processo de atendimento
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Elaborar Cronograma Operacional
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Estudo da nova ferramenta de atendimento - Etapa 1
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Estudo técnico para Solução de Atendimento Remoto às estações institucionais
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Estudos técnicos para Solução de Impressão
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Força Tarefa - Base de conhecimento PJe
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Planejar atualização do parque para Windows 11
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	POC de solução para substituição do Kaspersky como solução de gerenciamento de pacotes
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Procedimento para gestão e uso de imagens de PCs e notebooks
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Reformulação BI de Chamados - Especificação
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Renovação de computadores e monitores (2 lotes)
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	SAPI's - Revisão
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Substituição dos Notebooks dos Magistrados
GESTÃO	Ação	[Portal da SETIC] Ideação e Prototipação Visual
GESTÃO	Ação	2ª Fase do Piloto das SQUADS - Formalização do processo a ser expandido
GESTÃO	Ação	3ª Fase do Piloto das SQUADS

Indicadores de TIC - 2025

Dados em
formato CSV

Ações e
Projetos

Pessoal


Capacitação

Portfólio de
Soluções

Orçamento

Contratos

iGovTIC-JUD

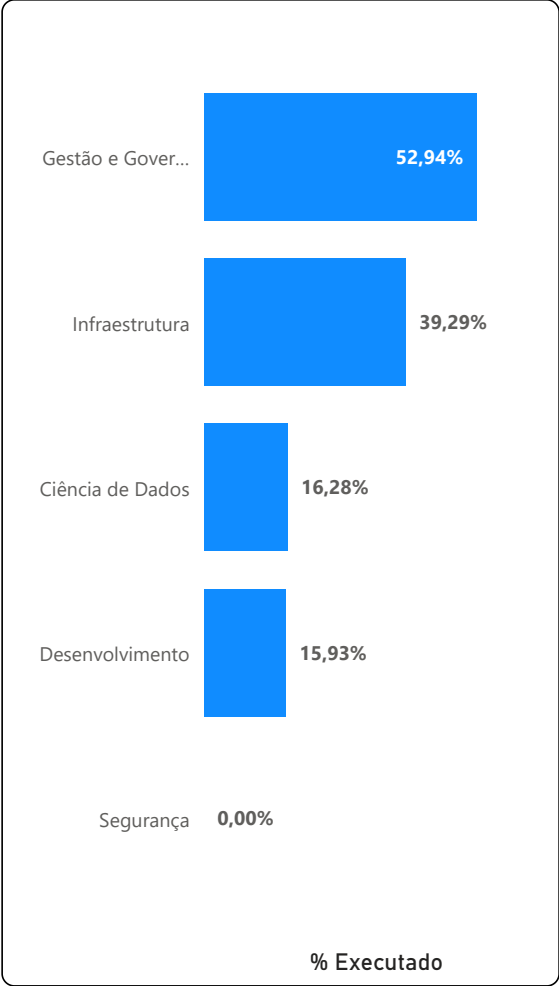

Tema

Todos

Previsão

Todos

29,12%

Executado

83

Realizado

285

Planejado

TEMA	CAPACITAÇÃO	PLANEJADO	REALIZADO
Ciência de Dados	A deep understanding of deep learning [57.5h]	4	
Ciência de Dados	Advanced NLP Techniques: Master Lora Fine Tuning with HF Transformers [0.5h]	4	2
Ciência de Dados	Data Analysis with Polars [5h]	3	1
Ciência de Dados	Deploying LLMs: A Practical Guide to LLMops in Production [5h]	4	
Ciência de Dados	DuckDB e Firecrawl Para Database e Web Scraping Analytics[8h]	1	1
Ciência de Dados	FastAPI - The Complete Course 2025 (Beginner + Advanced)	1	1
Ciência de Dados	Fine Tuning LLM with Hugging Face Transformers for NLP [16.5h]	4	
Ciência de Dados	Haystack - Customizable LLM pipelines for GenAI Applications [5h]	4	
Ciência de Dados	LLM Engineering: Master AI, Large Language Models & Agents [25h]	4	
Ciência de Dados	LLMs Mastery - Complete guide to Transformers and Generative AI [7.5h]	4	
Ciência de Dados	LLMs with Google Cloud and Python [5h]	4	1
Ciência de Dados	NLP - Natural Language Processing with Python [11.5h]	4	1
Ciência de Dados	Sumarização de Textos com Processamento de Linguagem Natural [5.5h]	2	
Desenvolvimento	Advanced SQL : The Ultimate Guide (2025)	5	
Desenvolvimento	Angular Testing	1	1
Desenvolvimento	Aprenda DOCKER do Zero ao Avançado	19	1
Desenvolvimento	Banco NoSQL	1	1
Desenvolvimento	Clean Code	17	
Desenvolvimento	Curso de Angular 2 (v17+) Typescript do Básico ao Avançado	2	
Desenvolvimento	Elasticsearch 8 and the Elastic Stack: In Depth and Hands On	4	
Desenvolvimento	Kubernetes	4	1
Desenvolvimento	Node JS Curso Completo do Básico ao Avancado	15	2

Indicadores de TIC - 2025

[Dados em formato CSV](#)

Ações e Projetos

Pessoal

Capacitação



Portfólio de Soluções

Orçamento



Contratos

iGovTIC-JUD



Custeio

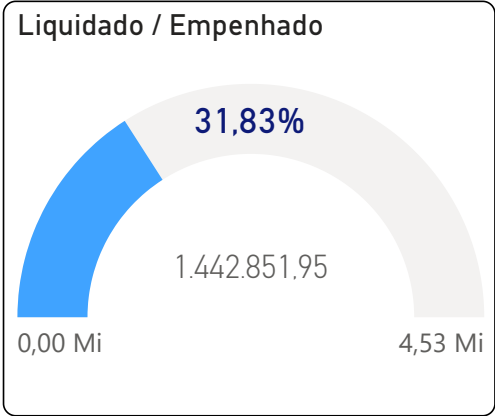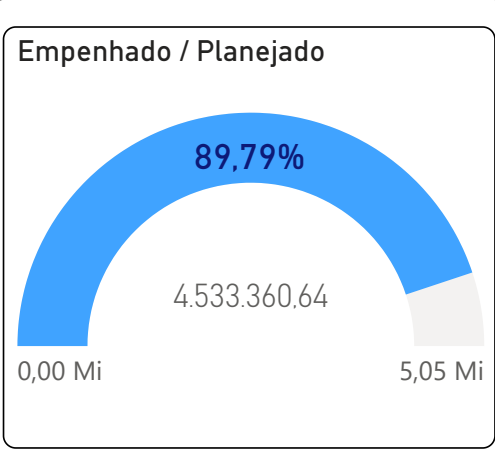

Permanente

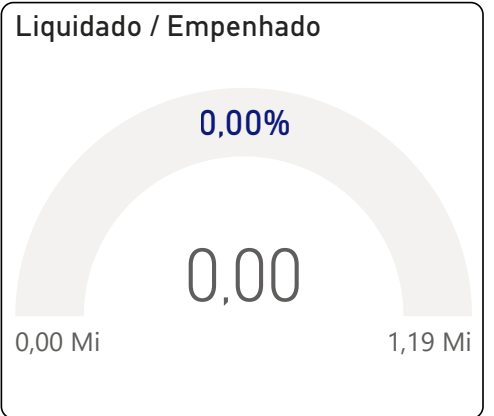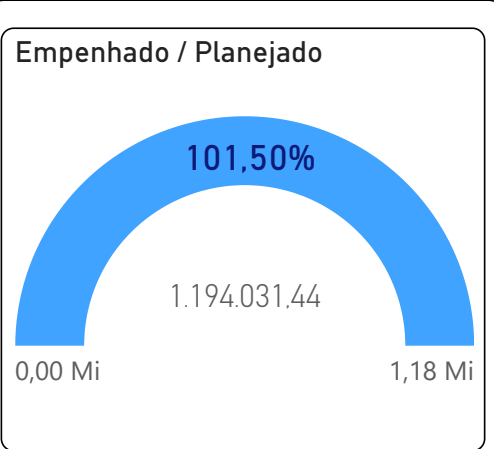


Total

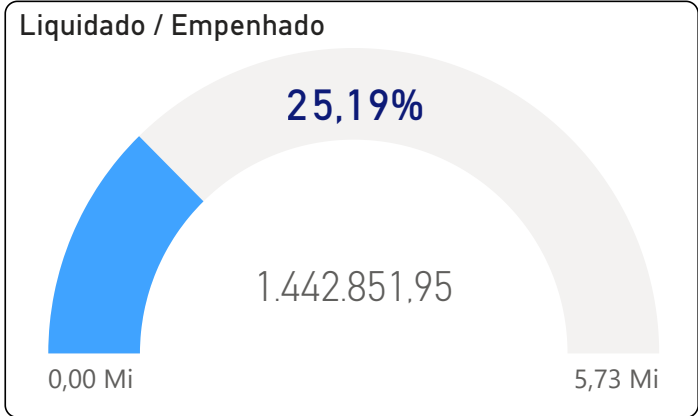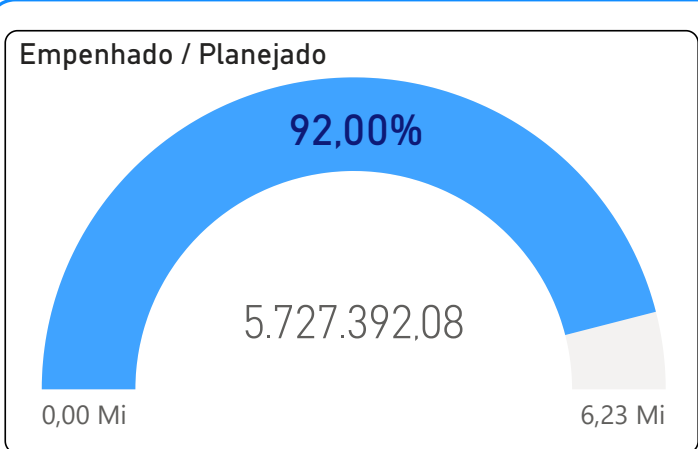

Indicadores de TIC - 2025

Dados em
formato CSV

- Ações e Projetos
- Pessoal
- Capacitação
- Portfólio de Soluções
- Orçamento
- Contratos
- iGovTIC-JUD

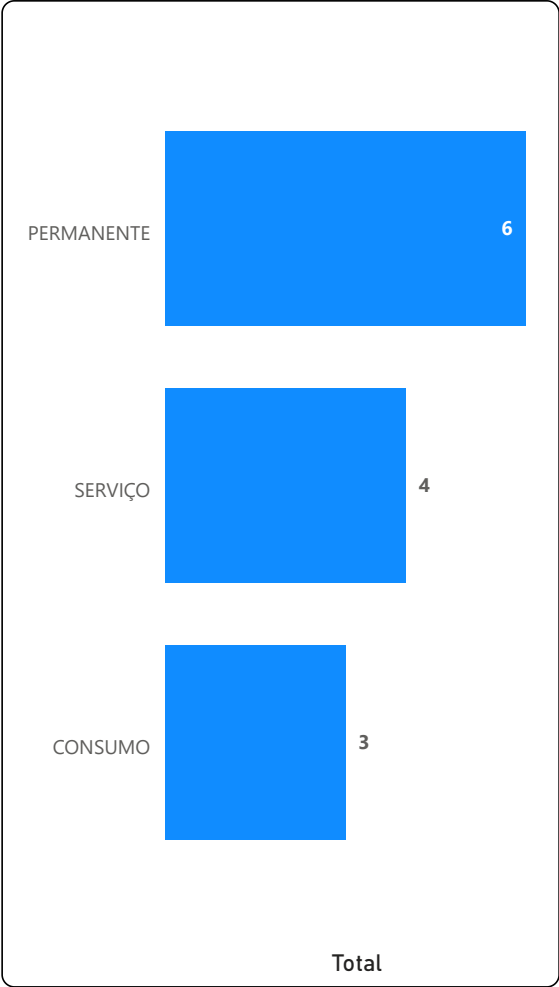

Prioridade		Status DFD		4.055.558,49			
1		Todos		Valor Estimado Total (R\$)			
Fonte Receita		Status ETP/TR		7			
Todos		Todos		Concluído			
Natureza Despesa		Status Empenho		13			
Todos		Todos		Planejado			
ID	Objeto	Gestor	Prioridade	Quantidade	Und Medida	Valor Estimado	
1445	Microcomputadores	SETIC	1	70	UNIDADE	945.000,00	R\$
1449	Solução de Impressão	SETIC	1	30	MÊS	50.000,00	R\$
1464	Roteadores de Internet	SETIC	1	6	UNIDADE	347.554,64	R\$
1475	Material de consumo de TIC	SETIC	1	1	UNIDADE	15.000,00	R\$
1476	Solução WiFi	SETIC	1	1	UNIDADE	607.783,00	R\$
1682	Notebooks	SETIC	1	9	UNIDADE	49.050,00	R\$
1683	Aquisição de monitores	SETIC	1	1050	UNIDADE	617.400,00	R\$
1684	Solução de prototipação de soluções de TIC	SETIC	1	1	UNIDADE	5.400,00	R\$
1685	Fibra apagada para site backup	SETIC	1	60	MÊS	16.000,00	R\$
1690	Solução Ataques Cibernéticos - XDR	SETIC	1	1	UNIDADE	724.108,35	R\$
1725	Extensão da garantia dos equipamentos que compõem o Sistema Blade	SETIC	1	48	MÊS	367.262,50	R\$
1732	Licenças de IA generativa para Chat do TRT	SETIC	1	30	LICENCA	72.000,00	R\$
1737	Servidor Rack com GPU para Soluções de IA	SETIC	1	1	UNIDADE	239.000,00	R\$

	Inclusões: 7			
	Alterações: 19			
	Exclusões: 1			
Alterações em ações no PDTIC				
Tema	Ação	Situação Atual	Alteração	Motivo
IA	Classificação Automática de Documentos Administrativos com IA para Conformidade LAI/LGPD no TRT-13	-	Inclusão no PDTIC	Desenvolver e integrar um sistema automatizado baseado em aprendizado de máquina ao PROAD-OUV, capaz de identificar e classificar de forma precisa documentos sigilosos e públicos, garantindo conformidade com a LGPD e a LAI, reduzindo erros de classificação manual e promovendo eficiência na gestão de documentos administrativos.
Sistemas	Saneamento e migração de informações de pessoal - Etapa 1	2º Trimestre	Ampliação de prazo: 2º Trimestre mais 3º Trimestre	Devido ao aumento do escopo, resultante da inclusão da análise do histórico de transformação das FC's e CJ's (que não fazia parte do escopo original), o prazo da ação deve ser expandido para o 3º trimestre
	Implementar BI de Chamados	3º Trimestre	Adiamento de prazo: para 2026	Iminência do fim do contrato do CITSmart, que é a principal fonte de dados para esta ação.
	[Meu Portal] Módulo de Notificações	4º Trimestre	Adiantamento de prazo: para 3º Trimestre	Relevante para a possibilidade de eventual integração com ferramenta de divulgação de mudanças nos sistemas (changelog)
	Design Systems do TRT-13	3º Trimestre	4º Trimestre	Repriorização de demandas e foco do 3º Trimestre
	Interface para movimentação de patrimônio no SCMP	2026	Adiantamento de prazo: para 4º Trimestre	Necessidade de resolver a demanda de facilitar o envio e recebimento do patrimônio
	[Meu Portal] Módulo Pendências e customização de cards	4º Trimestre	Adiamento de prazo: para 2026	Necessidade de foco no Módulo de Notificações, bem como foco da SEGEPE no saneamento de dados
	Dashboard de Produtos - Versão 3	4º Trimestre	Adiamento de prazo: para 2026	Necessidade de amadurecimento de IDP para avanço neste item
	Ampliação dos assuntos acessíveis por autoatendimento no SIGEP	4º Trimestre	Adiamento de prazo: para 2026	Foco da SEGEPE no saneamento de dados
	[Portal da SETIC] Versão 1.0	4º Trimestre	Adiamento de prazo: para 2026	Necessidade de amadurecimento de plataforma de Portais, bem como pré-requisito de ideação ser feita antes do desenvolvimento do portal
	Implantação da nova versão do SCMP	2026	Exclusão do PDTIC	O projeto está suspenso e não há previsão de retomada dos trabalhos. Há inclusive a possibilidade de não se utilizar o que foi desenvolvido e começar tudo do zero.
Infraestrutura	Revisão dos Perfis de Administradores	-	Inclusão no PDTIC - 3º Trimestre	Esta ação tem como objetivo revisar e atualizar os perfis de administradores de todos os ativos de infraestrutura e serviços sob responsabilidade da CITIC. Com a movimentação de servidores (entrada e saída de colaboradores), torna-se necessário reavaliar os acessos privilegiados, garantindo que apenas os profissionais autorizados mantenham permissões administrativas ativas.
	Instalação e configuração dos novos roteadores de Internet	4º Trimestre	Adiantamento de prazo: para 3º Trimestre	Adiantamento
	Migrar configuração do CDN/WAF para Terraform	3º Trimestre	Ampliação de prazo: 3º Trimestre mais 4º Trimestre	Adequação no prazo necessária para conclusão
	Sincronização do AD de HML com o AD de PRD	3º Trimestre	4º Trimestre	Repriorização de demandas e foco do 3º Trimestre
	Flows de rede centralizado	3º Trimestre	4º Trimestre	Repriorização de demandas e foco do 3º Trimestre
	Substituição do Switch Core	4º Trimestre	2026	Ainda não foi possível realizar a aquisição
	POC do JIRA como solução para gerenciamento dos boards das SQUADS (RDM e projetos)	2º Trimestre	Ampliação de prazo: 2º Trimestre mais 3º Trimestre	Ambiente finalizado, ampliado para abarcar uma POC com integração do JIRA com bookstack e changelog
	Adaptar Catálogo de Serviços ao novo formato de SQUADS [SQUADS] Estudo das demandas do SIGEP e Folha para minimizar trabalho operacional do N3	3º Trimestre	4º Trimestre	Pré-requisito de ampliação das SQUADS ainda não realizado
		4º Trimestre	Adiamento de prazo: para 2026	Foco da SEGEPE no saneamento de dados, repriorização DGTIC

Gestão	[Solução para IRDR] Ideação e Prototipação Visual	4º Trimestre	Adiamento de prazo: para 2026	Incertezas e redefinições da IA por determinações superiores
	Análise de métricas de produtos críticos e definição de gatilhos	3º Trimestre	Adiamento de prazo: para 2026	Repriorização de demandas e foco do 3º Trimestre, repriorização DGTIC
	IgovTIC - acompanhamento e gestão para o biênio	-	Inclusão no PDTIC - 3º Trimestre	Necessário trabalhar em respostas aos questionamentos que serão feitos em 2025 e planejar as ações para cumprimento em 2026
	Valorização de TI - definição de planos/normas/ações	-	Inclusão no PDTIC - 3º Trimestre	Necessário uma medida em vigor e consistente para pontuar no igovTIC
	Teletrabalho: apoio para definição de ferramentas e métodos para controle de metas	-	Inclusão no PDTIC - 3º Trimestre	Apoio será necessário para atender a demandas de auditoria e evolução gerencial na definição e acompanhamento de metas consistentes
Atendimento e Microinformática	POC solução audiovisual para salas de audiência e sessão	-	Inclusão no PDTIC - 3º Trimestre	Realização de POC com soluções de mercado para viabilizar modernização das salas de audiência e de sessão, sobretudo com objetivo de melhorar a qualidade da gravação, da transmissão online e da transcrição.
	Implantação GLPI	-	Inclusão no PDTIC - 3º Trimestre	Implantar e configurar a GLPI de forma que ela atenda a todas as necessidades atuais e possa ser colocada em produção no lugar no CITSmart
Alterações em OKRs no PDTIC				
Item	Objetivo	Situação Atual da Meta	Alteração na Meta	Motivo
-	-	-	-	-

		PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2025/2026										
TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	DATA CONCLUSÃO	PREVISÃO	DEMANDANTE	ALINHAMENTO	RISCOS	SITUAÇÃO	CONCLUÍDO	TRIMESTRE PREVISÃO	ATRASADO	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Estudo da nova ferramenta de atendimento - Etapa 1	06/07/2025	Jun/2025	SETIC	OT-12		Concluído	Sim	2	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Planejar atualização do parque para Windows 11	30/06/2025	Jun/2025		OT-07,OT-10		Concluído	Sim	2	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Atualização do ATO TRT GP Nº 355/2015 referente à abertura de chamados de TIC	30/06/2025	Jun/2025		OT-12		Concluído	Sim	2	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Força Tarefa - Base de conhecimento PJe	10/06/2025	Jun/2025	SETIC	OT-08,OT-10		Concluído	Sim	2	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Elaboração do manual/processo de atendimento	25/06/2025	Mar/2025	SETIC	OT-08		Concluído	Sim	1	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Elaborar Cronograma Operacional	02/06/2025	Jun/2025	SETIC			Concluído	Sim	2	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	POC de solução para substituição do Kaspersky como solução de gerenciamento de pacotes	29/05/2025	Jun/2025				Concluído	Sim	2	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Atualização Windows 11		Jun/2025				Em andamento	Não	2	Sim	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Substituição dos Notebooks dos Magistrados	02/05/2025	Mar/2025	JAP	OT-24		Concluído	Sim	1	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Estudo técnico para Solução de Atendimento Remoto às estações institucionais		Set/2025	SETIC			Priorizado	Não	3	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Capacitação PJe 1º e 2º graus para toda a equipe do DAU	13/02/2025	Mar/2025	SETIC	OT-08		Concluído	Sim	1	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Reformulação BI de Chamados - Especificação	15/03/2025	Mar/2025	DGTIC	OT-12		Concluído	Sim	1	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	SAPI's - Revisão		Set/2025	SETIC	OT-10,OT-11,OT-12		Pré-priorizado	Não	3	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Consolidação da auditoria de chamados	31/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-10,OT11		Concluído	Sim	1	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Ativos Físicos - Organização e Planejamento		Jun/2025		OT-24		Em andamento	Não	2	Sim	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Criar rotina de atualização remota periódica de perfis de usuário de estações e notebooks		Set/2025		OT-22		Em andamento	Não	3	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Procedimento para gestão e uso de imagens de PCs e notebooks		Set/2025		OT-08,OT-10		Em andamento	Não	3	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Estudos técnicos para Solução de Impressão	28/03/2025	Mar/2025	SADM			Concluído	Sim	1	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	VOIP - Transcrever e Registrar atendimento		Não Priorizado		OT-11		Backlog	Não	0	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Renovação de computadores e monitores (2 lotes)		Dez/2025		OT-24		Backlog	Não	4	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Migração de todos os artigos da BC para o novo modelo		Não Priorizado	SETIC	OT-09,OT-11		Backlog	Não	0	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Implantação do Portal da Internet		Não Priorizado		Sem alinhamento KR		Backlog	Não	0	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Minuta de Ato para Uso dos Bens de TIC		Não Priorizado		OT-10,OT-11,OT-12		Backlog	Não	0	Não	
SISTEMAS	Ação	Argos Poupa Convênios	01/07/2025	Jun/2025	SCR			Concluído	Sim	2	Não	
SISTEMAS	Ação	Configuração e disponibilização do PROGECOM	01/07/2025	Jun/2025				Concluído	Sim	2	Não	
SISTEMAS	Ação	Implantação do sistema e-Transporte	01/07/2025	Jun/2025	CSI			Concluído	Sim	2	Não	
SISTEMAS	Ação	Componente genérico para divulgação das mudanças nos próprios produtos	01/07/2025	Jun/2025	DGTIC	OT-09		Concluído	Sim	2	Não	
SISTEMAS	Ação	Estou aqui - melhorias na acessibilidade nos portais	12/06/2025	Jun/2025				Concluído	Sim	2	Não	
SISTEMAS	Projeto	Estudo para tecnologia do Portal da INTRANET e INTERNET	23/05/2025	Jun/2025	ACS			Concluído	Sim	2	Não	
SISTEMAS	Ação	Frontend do MVP da ARCA	06/05/2025	Jun/2025	Comitê IA	OT-01		Concluído	Sim	2	Não	
SISTEMAS	Ação	[Nacionalização PJe-Gestão] Integração ao PJe	24/04/2025	Jun/2025	SCR	ON-11		Concluído	Sim	2	Não	
SISTEMAS	Ação	Implantação do extrator nacional do Datajud	24/04/2025	Jun/2025	SEGEJUD			Concluído	Sim	2	Não	

		PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2025/2026										
TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	DATA CONCLUSÃO	PREVISÃO	DEMANDANTE	ALINHAMENTO	RISCOS	SITUAÇÃO	CONCLUÍDO	TRIMESTRE PREVISÃO	ATRASADO	
SISTEMAS	Ação	Implantação PJe - Versão com MFA	31/03/2025	Mar/2025	CSJT	OT-21		Concluído	Sim	1	Não	
SISTEMAS	Ação	[Meu Portal] Módulo Pendências e customização de cards		Set/2025	SEGEPE	ON-02,OT-04		Em andamento	Não	3	Não	
SISTEMAS	Ação	Migração das páginas do Portal de INTRANET		Set/2025				Em andamento	Não	3	Não	
SISTEMAS	Projeto	Refatoração do OpenWebUI	28/03/2025	Mar/2025	Comitê IA	ON-06,ON-10,OT-01		Concluído	Sim	1	Não	
SISTEMAS	Ação	Monitoramento e ajustes para estabilidade do portal da transparência	28/03/2025	Jun/2025	JAP			Concluído	Sim	2	Não	
SISTEMAS	Ação	Solução para o Memorial do TRT-13 (comemoração dos 40 anos)		Set/2025	SADM			Pré-priorizado	Não	3	Não	
SISTEMAS	Ação	Monitoramento das páginas da prestação de contas e transparência		Set/2025	SECAUD			Pré-priorizado	Não	3	Não	
SISTEMAS	Ação	Gestão de Banco de Horas de Servidores e Magistrados		Dez/2025	SEGEPE	ON-01,ON-02		Backlog	Não	4	Não	
SISTEMAS	Ação	Estudo da migração do SIGEP	28/03/2025	Mar/2025	SEGEPE	ON-03		Concluído	Sim	1	Não	
SISTEMAS	Ação	Design Systems do TRT-13		Dez/2025	SETIC	OT-06		Backlog	Não	4	Não	
SISTEMAS	Ação	Interface para movimentação de patrimônio no SCMP		Dez/2025	SADM			Backlog	Não	4	Não	
SISTEMAS	Ação	Implantação de 3 novos robôs		Não Priorizado	SCR	Sem alinhamento KR		Backlog	Não	0	Não	
SISTEMAS	Ação	[Meu Portal] Módulo de Notificações		Não Priorizado	SEGEPE	ON-02,OT-04		Backlog	Não	0	Não	
SISTEMAS	Ação	Padronização e organização de Relatórios do SAOAdm		Não Priorizado		OT-06,OT-16		Backlog	Não	0	Não	
SISTEMAS	Ação	Dashboard de Produtos - Versão 3		Não Priorizado	DGTIC	OT-04,OT-07		Backlog	Não	0	Não	
SISTEMAS	Ação	Ampliação dos assuntos acessíveis por autoatendimento no SIGEP		Não Priorizado	SEGEPE	ON-01		Backlog	Não	0	Não	
SISTEMAS	Ação	[Portal da SETIC] Versão 1.0		Não Priorizado	SETIC	OT-09		Backlog	Não	0	Não	
SISTEMAS	Ação	Implementar BI de Chamados		Não Priorizado	SETIC	OT-12		Backlog	Não	0	Não	
SISTEMAS	Ação	Implantação do Concilia JT		Set/2025				Pré-priorizado	Não	3	Não	
SISTEMAS	Ação	Desenvolvimento de uma IDP (Internal Developer Platform) - Escopo Inicial	28/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-13,OT-15,OT-16,OT-17		Concluído	Sim	1	Não	
SISTEMAS	Ação	Implantação da nova versão do SCMP		Não Priorizado				Backlog	Não	0	Não	
SISTEMAS	Ação	Saneamento e migração de informações de pessoal - Etapa 1		Set/2025	SEGEPE	ON-01		Em andamento	Não	3	Não	
SISTEMAS	Ação	Sistema Unificado de Autorização e Permissionamento		Não Priorizado		OT-10,OT-18,OT-22,OT-11,OT-12		Backlog	Não	0	Não	
SISTEMAS	Ação	Integração do STARS aos sistemas nacionais		Não Priorizado	DGTIC	OT-04		Backlog	Não	0	Não	
SISTEMAS	Ação	Implantação do SMD em Produção		Não Priorizado	JAP	OT-04		Backlog	Não	0	Não	
SISTEMAS	Ação	Automação da preparação das sessões de julgamento		Jun/2025	SEGEJUD			Em andamento	Não	2	Sim	
SISTEMAS	Projeto	Desenvolver medidor de nível de "juridiquês" com base em banco de palavras		Não Priorizado	JAP	ON-07		Backlog	Não	0	Não	
SISTEMAS	Ação	Plataforma de Ordens de Serviço - CAEMA		Não Priorizado	CAEMA			Backlog	Não	0	Não	
SISTEMAS	Ação	Certidão automática de aprovação em concurso público		Não Priorizado		OT-01		Backlog	Não	0	Não	
GESTÃO	Ação	3ª Fase do Piloto das SQUADS	27/06/2025	Jun/2025	SETIC	OT-25		Concluído	Sim	2	Não	
GESTÃO	Ação	Ideação para evolução da Arca	27/06/2025	Jun/2025		OT-01,ON-8,ON-9,ON-10		Concluído	Sim	2	Não	
GESTÃO	Ação	Piloto do modelo de divulgação da SETIC	16/06/2025	Jun/2025	SETIC	OT-12		Concluído	Sim	2	Não	
GESTÃO	Ação	Ideação para Memorial e 40 anos do TRT	12/06/2025	Jun/2025				Concluído	Sim	2	Não	
GESTÃO	Ação	Prototipação da ARCA	09/05/2025	Jun/2025	Comitê IA	OT-06,OT-08		Concluído	Sim	2	Não	
GESTÃO	Ação	Design Systems do TRT-13		Dez/2025	SETIC	OT-06		Backlog	Não	4	Não	
GESTÃO	Ação	Adaptar Catálogo de Serviços ao novo formato de SQUADS		Dez/2025	DGTIC	OT-12		Backlog	Não	4	Não	
GESTÃO	Ação	[SQUADS] Estudo das demandas do SIGEP e Folha para minimizar trabalho operacional do N3		Não Priorizado	SETIC	OT-05,OT-09,OT-10,OT-19		Backlog	Não	0	Não	
GESTÃO	Ação	Estabelecer linhas de base para OKRs do Plano Estratégico de TIC 2025-2026	30/03/2025	Mar/2025	SETIC	Todos		Concluído	Sim	1	Não	
GESTÃO	Ação	[Solução para IRDR] Ideação e Prototipação Visual		Não Priorizado		ON-04,ON-05		Backlog	Não	0	Não	
GESTÃO	Ação	Estudos técnicos para aquisição de Solução de Prototipação	31/03/2025	Mar/2025	DGTIC	OT-06,OT-13		Concluído	Sim	1	Não	
GESTÃO	Ação	Analisar documento do processo de gestão de projetos		Não Priorizado		Sem alinhamento KR		Backlog	Não	0	Não	
GESTÃO	Ação	Prototipação de componente genérico para divulgação do changelog dentro dos próprios produtos	31/03/2025	Mar/2025	DGTIC	OT-09		Concluído	Sim	1	Não	
GESTÃO	Ação	POC do JIRA como solução para gerenciamento dos boards das SQUADS (RDM e projetos)		Set/2025	SETIC	OT-12		Em andamento	Não	3	Não	

		PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2025/2026										
TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	DATA CONCLUSÃO	PREVISÃO	DEMANDANTE	ALINHAMENTO	RISCOS	SITUAÇÃO	CONCLUÍDO	TRIMESTRE PREVISÃO	ATRASADO	
GESTÃO	Ação	Ampliação das SQUADs		Set/2025	SETIC	OT-05,OT-09,OT-10,OT-19		Pré-priorizado	Não	3	Não	
GESTÃO	Ação	Estruturar eventos do "Mês da Tecnologia"		Set/2025	SETIC	OT-09		Pré-priorizado	Não	3	Não	
GESTÃO	Ação	[Portal da SETIC] Ideação e Prototipação Visual		Set/2025	SETIC	OT-06,OT-09		Priorizado	Não	3	Não	
GESTÃO	Ação	2ª Fase do Piloto das SQUADs - Formalização do processo a ser expandido	28/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-05,OT-09,OT-10,OT-19		Concluído	Sim	1	Não	
GESTÃO	Ação	Novo Modelo de divulgação da TI	24/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-12		Concluído	Sim	1	Não	
GESTÃO	Ação	Análise de métricas de produtos críticos e definição de gatilhos		Não Priorizado	SETIC	OT-04		Backlog	Não	0	Não	
GESTÃO	Ação	Relatório de Gestão	20/01/2025	Mar/2025	GDG			Concluído	Sim	1	Não	
GESTÃO	Ação	Formalizar processo de ideação e prototipação		Não Priorizado		OT-06		Backlog	Não	0	Não	
INFRAESTRUTURA	Ação	Especificação das redes sem fio a serem implantadas com a nova solução de WIFI	30/06/2025	Jun/2025	SETIC	OT-22,OT-24		Concluído	Sim	2	Não	
INFRAESTRUTURA	Ação	Testes TOP NIC BR - Adequação ao CNJ	06/06/2025	Jun/2025				Concluído	Sim	2	Não	
INFRAESTRUTURA	Ação	Instalação e configuração da nova rede sem fio		Set/2025	SETIC	OT-22 OT-24		Em andamento	Não	3	Não	
INFRAESTRUTURA	Ação	Modernização da Infraestrutura de Servidores Blade	08/06/2025	Jun/2025		OT-24		Concluído	Sim	2	Não	
INFRAESTRUTURA	Ação	Habilitar Endpoint Compliance na VPN	06/06/2025	Jun/2025	SETIC	OT-18,OT-22		Concluído	Sim	2	Não	
INFRAESTRUTURA	Ação	[iGov] Site Backup - Abrigar as cópias de segurança em local distinto da Sede		Set/2025	SETIC	OT-23,OT-22		Em andamento	Não	3	Não	
INFRAESTRUTURA	Ação	Aprimorar Monitoramento dos Serviços Críticos	06/06/2025	Jun/2025	SETIC	OT-22		Concluído	Sim	2	Não	
INFRAESTRUTURA	Ação	Migrar ambiente dos sistemas administrativos para novo storage	30/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-24		Concluído	Sim	1	Não	
INFRAESTRUTURA	Ação	Definir arquitetura de redundância para roteadores WAN	30/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-24		Concluído	Sim	1	Não	
INFRAESTRUTURA	Ação	Criar planos de restauração dos serviços essenciais	30/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-23		Concluído	Sim	1	Não	
INFRAESTRUTURA	Ação	Atualização do Firewall	30/01/2025	Mar/2025	SETIC	OT-18 OT-22		Concluído	Sim	1	Não	
INFRAESTRUTURA	Ação	Recriar ambiente de homologação para os sistemas administrativos		Set/2025	SETIC	OT-25,OT-26		Pré-priorizado	Não	3	Não	
INFRAESTRUTURA	Ação	Migrar ambiente do PJe para novo storage	16/01/2025	Mar/2025	SETIC	OT-24		Concluído	Sim	1	Não	
INFRAESTRUTURA	Ação	Instalação de Servidor com GPU para processamento da IA na infraestrutura local do TRT-13	18/01/2025	Mar/2025	SETIC	ON-06		Concluído	Sim	1	Não	
INFRAESTRUTURA	Ação	Instalação e configuração dos novos roteadores de Internet		Set/2025		OT-23,OT-24,OT-26		Pré-priorizado	Não	3	Não	
INFRAESTRUTURA	Ação	Migrar configuração do CDN/WAF para Terraform		Dez/2025	SETIC	OT-18,OT-22		Pré-priorizado	Não	4	Não	
INFRAESTRUTURA	Ação	Sincronização do AD de HML com o AD de PRD		Dez/2025		OT-25		Backlog	Não	4	Não	
INFRAESTRUTURA	Ação	Flows de rede centralizado		Dez/2025	SETIC	OT-22		Backlog	Não	4	Não	
INFRAESTRUTURA	Ação	Substituição do Switch Core		Não Priorizado	SETIC	OT-24,OT-26		Backlog	Não	0	Não	
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implementar controles de permissionamento do NAC		Set/2025	SETIC	OT-20		Pré-priorizado	Não	3	Não	
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantação da solução XDR		Jun/2025		OT-22		Em andamento	Não	2	Sim	
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Estudo Técnico Preliminar (ETP) de Solução de Antivírus	01/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-22		Concluído	Sim	1	Não	
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Absorção da gestão e operação do NAC		Set/2025	SETIC	OT-20		Pré-priorizado	Não	3	Não	
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Estudo de soluções SSO (Single-sign-on) para o ambiente da rede Interna.	15/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-06,OT-22		Concluído	Sim	1	Não	
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantar a verificação de conformidade para todas as conexões VPN		Set/2025	SETIC	OT-20		Pré-priorizado	Não	3	Não	
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Integrar o Tenable WAS à esteira de desenvolvimento		Não Priorizado		OT18,OT19,OT22		Backlog	Não	0	Não	
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantação do 2FA nos sistemas expostos na internet	14/05/2025	Jun/2025		OT-06,OT-22		Concluído	Sim	2	Não	
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantação de varreduras periódicas para todas as aplicações Web do TRT-13	11/06/2025	Jun/2025	SETIC	OT-18,OT-22		Concluído	Sim	2	Não	
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantação de varreduras periódicas nas estações do CITIC e armazenamento de imagens	06/06/2025	Jun/2025	SETIC	OT-22		Concluído	Sim	2	Não	
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Absorção da gestão e operação da solução de proteção de Endpoint		Não Priorizado		OT22		Backlog	Não	0	Não	
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Revisar os procedimentos de Gestão de Identidade e Acesso para perfis administrativos		Não Priorizado		OT18,OT22		Backlog	Não	0	Não	
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Integrar o Cloud Security e AWS à esteira de desenvolvimento		Não Priorizado		OT18,OT19,OT22		Backlog	Não	0	Não	
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Experimentos de fine-tuning para criação de modelos especialistas		Dez/2025	SEGEJUD	ON-10		Backlog	Não	4	Não	
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Projeto	Desenvolver solução de IA para simplificação de linguagem em decisões judiciais		Não Priorizado	JAP	ON-07		Backlog	Não	0	Não	

[illegible]

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC	OBSERVAÇÃO	CGOVTIC
Atualizar Pannel de Monitoramento de TIC 2025	iGovTIC-Jud	Fev/2025	Fev/2025	Concluído	OE09	OE05	Painel de Monitoramento de TIC	CGOVTIC 01/2025: Aprovada execução
Apoiar elaboração do Plano Diretor de TIC 2025/2026	iGovTIC-Jud	Mar/2025	Abr/2025	Concluído	OE09	OE05	PDTIC 2025/2026	
Elaborar normativo que aprova o PDTIC 2025/2026	iGovTIC-Jud	Mar/2025	Abr/2025	Concluído	OE09	OE05		ATO TRT13.SGP N.º 087/2025
Revisar o Plano de Transformação Digital (PTD)	iGovTIC-Jud	Ago/2025		Removido	OE09	OE02	CNJ vai usar o PTD da JT elaborado pelo CSJT	CGOVTIC 01/2025: Priorizado
Apoiar a SEGGEST na Coordenação do Prêmio CNJ de Qualidade	SEGGEST	Jul/2025		Em andamento	OE09	OE05		CGOVTIC 01/2025: Aprovada execução
Apoiar na manutenção do Observatório Institucional de Metas e Planejamento (Olimpo)	SEGGEST	Dez/2025		Em andamento	OE09	OE05	Olimpo	CGOVTIC 01/2025: Aprovada execução
Elaboração e envio das evidências para o iGovTIC-Jud 2025	iGovTIC-Jud	Mai/2025	Mai/2025	Concluído	OE09	OE05		Portaria CNJ nº 101/2025
Revisão dos processos de elaboração e monitoramento dos contratos e orçamento de TIC	iGovTIC-Jud	Nov/2025		Pré-priorizado	OE09	OE05		
Revisar o Catálogo de Serviços de TIC	iGovTIC-Jud	Set/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Estudo Quantitativo e de Rotatividade de Pessoal de TIC	iGovTIC-Jud ENTIC-JUD, Art. 26	Jun/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05	ENTIC-JUD	
Revisar o Processo de Gerenciamento de Níveis de Serviço	iGovTIC-Jud	Ago/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Realizar Pesquisa de Satisfação com os Serviços de TIC	PEI	Out/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Processo de Gerenciamento de Ativos e Configuração	iGovTIC-Jud	Nov/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05		

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC	OBSERVAÇÃO	CGOVTIC
Revisar a Política de Gestão de Pessoas de TIC - PGPTIC	ENTIC-Jud, Art. 24	Dez/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05	RA TRT13 N.º 114/2019 ENTIC-JUD	
Apoiar a Coordenação do Prêmio CNJ de Qualidade	SEGGEST	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Manutenção do Observatório Institucional de Metas e Planejamento (Olimpo)	SEGGEST	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05	Olimpo	
Revisar o Plano de Transformação Digital (PTD)	iGovTIC-Jud	2026		Aguardando priorização	OE09	OE02	PTD	
Revisar o Processo de Gerenciamento de Problemas	iGovTIC-Jud	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Processo de Gerenciamento de Mudanças	iGovTIC-Jud	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Processo de Gerenciamento de Eventos de TIC	iGovTIC-Jud	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Processo de Gerenciamento da Disponibilidade e Capacidade de TIC	iGovTIC-Jud	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Estudo Quantitativo e de Rotatividade de Pessoal de TIC	iGovTIC-Jud ENTIC-JUD, Art. 26	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05	ENTIC-JUD	
Realizar Pesquisa de Satisfação com os Serviços de TIC	PEI	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		

ENTIC-JUD - Objetivos Estratégicos (2021 a 2026)

- 01 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
- 02 - Promover a Transformação Digital
- 03 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores
- 04 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa

PEI TRT13/PEJT - Objetivos Estratégicos (2021 a 2026)

- 01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;
- 02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;
- 03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;
- 04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De Gestão Praticados;

Em andamento

Pré-priorizado

Priorizado

Em atraso

Concluído

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC	OBSERVAÇÃO	CGOVTIC
05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão		05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;						Removido
06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações		06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas;						
07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;						
08 - Promover Serviços de Infraestruturaestrutura e Soluções Corporativas		08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;						
		09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;						
		10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.						

PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - 2025

TEMA	CAPACITAÇÃO	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO	CUSTO	JUSTIFICATIVA
Infraestrutura	Central de Serviços com GLPI [29h]	Dez/2025	3		R\$ 0,00	Capacitar servidores na operacionalização da ferramenta GLPI.
Infraestrutura	Curso de Zabbix 7! Completo e atualizado v2025! [30h]	Jun/2025	3	3	R\$ 0,00	Atualizar servidores sobre as mais recentes funcionalidades da ferramenta de monitoramento Zabbix.
Infraestrutura	Grafana: Dashboards Gerenciais + Monitoramento [3h]	Set/2025	5	3	R\$ 0,00	Capacitar servidores na confecção de dashboards de monitoramento.
Infraestrutura	Monitoramento de aplicações com Prometheus e Grafana [6h]	Set/2025	4		R\$ 0,00	Capacitar servidores na confecção de dashboards de monitoramento.
Infraestrutura	Curso completo de Mikrotik do básico ao avançado [28h]	Dez/2025	2		R\$ 0,00	Capacitar servidores na configuração, administração e troubleshooting de dispositivos Mikrotik, otimizando a gestão de redes corporativas.
Infraestrutura	Redes Wireless - Curso Básico Profissional [6,5h]	Set/2025	2	2	R\$ 0,00	Introduzir servidores aos conceitos básicos de redes wireless, permitindo a implementação e manutenção de redes sem fio de pequeno e médio porte.
Infraestrutura	Redes Wireless - Curso Intermediário Profissional [5h]	Set/2025	2		R\$ 0,00	Aprimorar o conhecimento técnico dos servidores em redes wireless, com foco em soluções de maior complexidade e cobertura.
Infraestrutura	The Ultimate WLAN and WiFi Training Course [7h]	Set/2025	2		R\$ 0,00	Especializar servidores em redes Wi-Fi, abordando aspectos avançados de design, implementação e otimização de redes sem fio corporativas.
Infraestrutura	Formação em Redes de Computadores - Módulo 1 [9h]	Mar/2025	2	2	R\$ 0,00	Capacitar servidores nos fundamentos e práticas de redes de computadores, abrangendo desde conceitos básicos até tópicos avançados, para garantir o planejamento, implementação e manutenção eficiente da infraestrutura de rede corporativa.
Infraestrutura	Formação em Redes de Computadores Módulo 2 [7h]	Mar/2025	2	2	R\$ 0,00	Capacitar servidores nos fundamentos e práticas de redes de computadores, abrangendo desde conceitos básicos até tópicos avançados, para garantir o planejamento, implementação e manutenção eficiente da infraestrutura de rede corporativa.
Infraestrutura	Formação em Redes de Computadores - Módulo 3 [9h]	Jun/2025	3	2	R\$ 0,00	Capacitar servidores nos fundamentos e práticas de redes de computadores, abrangendo desde conceitos básicos até tópicos avançados, para garantir o planejamento, implementação e manutenção eficiente da infraestrutura de rede corporativa.
Infraestrutura	Formação em Redes de Computadores - Módulo 4 [8,5h]	Jun/2025	3	1	R\$ 0,00	Capacitar servidores nos fundamentos e práticas de redes de computadores, abrangendo desde conceitos básicos até tópicos avançados, para garantir o planejamento, implementação e manutenção eficiente da infraestrutura de rede corporativa.
Infraestrutura	Terraform - Do Básico ao Avançado [14,5h]	Set/2025	4	2	R\$ 0,00	Capacitar servidores na utilização do Terraform para automação de infraestrutura como código (IaC), otimizando a gestão e provisionamento de recursos.
Infraestrutura	The Complete Git Guide: Understand and master Git and GitHub [23h]	Dez/2025	1		R\$ 0,00	Capacitar servidores no uso de Git e GitHub, promovendo boas práticas de versionamento e colaboração em projetos de TI.
Infraestrutura	Certified Kubernetes Administrator (CKA) with Practice Tests [32h]	Dez/2025	5		R\$ 0,00	Qualificar servidores para a administração de clusters Kubernetes, garantindo a alta disponibilidade e escalabilidade de aplicações containerizadas.
Infraestrutura	Argo Workflows: The Complete Practical Guide : Unlock DevOps [10h]	Dez/2025	3		R\$ 0,00	Capacitar servidores na automação de workflows DevOps com Argo, otimizando o gerenciamento de pipelines de CI/CD.
Infraestrutura	SRE: Mastering Site Reliability Engineering - PT-BR [5h]	Set/2025	4		R\$ 0,00	Desenvolver competências em engenharia de confiabilidade de sites (SRE), promovendo a resiliência e eficiência dos serviços de TI.
Infraestrutura	Segurança em Aplicações WEB [7,5h]	Set/2025	2	1	R\$ 0,00	Capacitar servidores na identificação e mitigação de vulnerabilidades em aplicações web, fortalecendo a segurança cibernética da organização.

		PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - 2025				
TEMA	CAPACITAÇÃO	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO	CUSTO	JUSTIFICATIVA
Infraestrutura	HAProxy & keepalived: Alta Disponibilidade para Linux [7,5h]	Mar/2025	1	1	R\$ 0,00	Capacitar servidores na configuração de alta disponibilidade em sistemas Linux, utilizando HAProxy e keepalived para balanceamento de carga e failover.
Infraestrutura	HAProxy for Beginners [1,5h]	Mar/2025	2	2	R\$ 0,00	Introduzir servidores ao uso do HAProxy, capacitando-os para implementar soluções básicas de balanceamento de carga.
Infraestrutura	OWASP API Security Top 10 and Beyond	Mar/2025	1	1	R\$ 0,00	Capacitar servidores na identificação e mitigação de vulnerabilidades, alinhando-se às melhores práticas do OWASP.
Segurança	Pentest Professional Enterprise	Novembro - 2025	1		R\$ 5.494,00	Aquisição de conhecimentos em ferramentas de ataque, varredura de vulnerabilidades, segurança ofensiva, coleta de informações, engenharia social, mapeamento de redes, ataques força bruta.
Segurança	DevSecOps Fundamentals - Including Hands-On Demos	Agosto - 2025	2		R\$ 0,00	Aquisição de conhecimento sobre problemas comuns de segurança de aplicativos da web (como os do OWASP Top 10), segurança do Linux, como usar e implementar ferramentas DevSecOps, priorização dos problemas mais importantes encontrados em seus pipelines de CI/CD de DevSecOps.
Segurança	ESR - Security+ EAD (Parceria Oficial CompTIA)	Dezembro - 2025	2		R\$ 12.000,00	Aquisição de conhecimento para Analisar e Avaliar Vulnerabilidades e Riscos, Implementar e Gerenciar Segurança de Identidade e Acesso, Desenvolver Soluções de Segurança para Redes Locais, Endpoints e Nuvem, Monitorar e Responder a Incidentes de Segurança;
Desenvolvimento	Kubernetes	2025	4	1	R\$ 0,00	Capacitação em tecnologias para melhorar a arquitetura e monitoramento dos sistemas
Desenvolvimento	Observability with Grafana, Prometheus,Loki, Alloy and Tempo	2025	3	2	R\$ 0,00	Capacitação em tecnologias para melhorar a arquitetura e monitoramento dos sistemas
Desenvolvimento	SpringBoot Básico	2025	1	1	R\$ 0,00	Atualização de conhecimentos no framework de backend utilizado pela stack de sistemas nacionais (por exemplo, PDPJ e arquitetura PJe do CSJT)
Desenvolvimento	SpringBoot Avançado	2025	6	1	R\$ 0,00	Atualização de conhecimentos no framework de backend utilizado pela stack de sistemas nacionais (por exemplo, PDPJ e arquitetura PJe do CSJT)
Desenvolvimento	Elasticsearch 8 and the Elastic Stack: In Depth and Hands On	2025	4		R\$ 0,00	Capacitação em tecnologias para melhorar a arquitetura e monitoramento dos sistemas
Desenvolvimento	Node JS Curso Completo do Básico ao Avançado	2025	15	2	R\$ 0,00	Atualizar as equipes em relação a novas tecnologias de mercado que possam ser utilizadas no desenvolvimento de sistemas
Desenvolvimento	Advanced SQL : The Ultimate Guide (2025)	2025	5		R\$ 0,00	Na sustentação de sistemas corriqueiramente há demanda para a criação de relatórios e consultas de BD complexas. É importante que a equipe aprofunde o conhecimento no quesito performance, para minimizar o tempo de execução dos relatórios.
Desenvolvimento	Oracle SQL Performance Tuning Masterclass	2025	3		R\$ 0,00	Oracle é um dos principais SGBDs utilizados no TRT13. Na sustentação de sistemas corriqueiramente há demanda para a criação de relatórios e consultas de BD complexas. É importante que a equipe aprofunde o conhecimento no quesito performance, para minimizar o tempo de execução dos relatórios.
Desenvolvimento	Clean Code	2025	17		R\$ 0,00	Aprimorar a qualidade do código desenvolvido de forma que o custo de manutenção seja reduzido
Desenvolvimento	Testes unitários com JUnit 5	2025	19		R\$ 0,00	Aprimorar o conhecimento da equipe no quesito testes, tendo em vista que essa será uma exigência obrigatória, para as funcionalidades críticas, no pipeline de desenvolvimento.

PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - 2025

TEMA	CAPACITAÇÃO	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO	CUSTO	JUSTIFICATIVA
Desenvolvimento	Aprenda DOCKER do Zero ao Avançado	2025	19	1	R\$ 0,00	Nivelar o conhecimento da equipe na ferramenta para padronizar o ambiente de desenvolvimento em containers e facilitar a mudança de contexto, bem como encurtar o tempo de configuração de ambiente de um novo integrante das equipes.
Desenvolvimento	Curso de Angular 2 (v17+) Typescript do Básico ao Avançado	2025	2		R\$ 0,00	Atualização de conhecimentos no framework de frontend utilizado pela stack de sistemas nacionais (por exemplo, PDPJ e arquitetura PJe do CSJT)
Desenvolvimento	Python for Beginners - Go from Java to Python in 100 Steps	2025	6	1	R\$ 0,00	Auxiliar a equipe na confecção de scripts e soluções de pouca complexidade
Desenvolvimento	SQL para Análise de Dados: Do básico ao avançado	2025	1	1	R\$ 0,00	Fortalecer a base do conhecimento em SQL em novos integrantes da CDSS. Na sustentação de sistemas corriqueiramente há demanda para a criação de relatórios e consultas de BD. É importante que os novos integrantes ganhem cada vez mais conhecimento sobre a elaboração de consultas em SQL.
Desenvolvimento	Programação Básica	2025	1	1	R\$ 0,00	Introduzir conceitos de programação para o servidor que chegou recentemente à SETIC com conhecimento muito básico em programação.
Desenvolvimento	Programação Básica	2025	1	1	R\$ 0,00	Consolidar o aprendizado de programação colocando em prática com uma linguagem específica
Desenvolvimento	Testes de Software	2025	1	1	R\$ 0,00	Introduzir conceitos de programação para o servidor que chegou recentemente à SETIC com conhecimento muito básico em programação.
Desenvolvimento	Sistema de Controle de Material e Patrimônio - SCMP	2025	3	3	R\$ 0,00	Introduzir conceitos de programação para o servidor que chegou recentemente à SETIC com conhecimento muito básico em programação.
Desenvolvimento	Angular Testing	2025	1	1	R\$ 0,00	Conceitos e prática de teste unitário em frontend. Utilizando a tecnologia Angular, que é a linguagem de frontend do PJe
Desenvolvimento	Banco NoSQL	2025	1	1	R\$ 0,00	Aprendizado em novos conceitos de base de dados para prospectar soluções mais adequadas às demandas do tribunal
Ciência de Dados	A deep understanding of deep learning [57.5h]	2025	4		R\$ 0,00	Curso avançado de Deep Learning
Ciência de Dados	NLP - Natural Language Processing with Python [11.5h]	2025	4	1	R\$ 0,00	Visão geral de processos e bibliotecas de NLP
Ciência de Dados	Data Analysis with Polars [5h]	2025	3	1	R\$ 0,00	Biblioteca utilizada nos fluxos de dados
Ciência de Dados	LLMs with Google Cloud and Python [5h]	2025	4	1	R\$ 0,00	Projeto Chat: Acesso às LLMs por API
Ciência de Dados	LLMs Mastery - Complete guide to Transformers and Generative AI [7.5h]	2025	4		R\$ 0,00	Visão geral de processos e bibliotecas de utilização de LLMs
Ciência de Dados	Advanced NLP Technics: Master Lora Fine Tuning with HF Transformers [0.5h]	2025	4	2	R\$ 0,00	Visão geral do processo de fine tuning
Ciência de Dados	Deploying LLMs: A Practical Guide to LLMOps in Production [5h]	2025	4		R\$ 0,00	Introdução a MLOps e LLMOps
Ciência de Dados	Sumarização de Textos com Processamento de Linguagem Natural [5.5h]	2025	2		R\$ 0,00	Práticas de sumarização em NLP
Ciência de Dados	Fine Tuning LLM with Hugging Face Transformers for NLP [16.5h]	2025	4		R\$ 0,00	Curso avançado de fine tuning
Ciência de Dados	Haystack - Customizable LLM pipelines for GenAI Applications [5h]	2025	4		R\$ 0,00	Biblioteca especializada na criação de aplicações com LLMs
Ciência de Dados	LLM Engineering: Master AI, Large Language Models & Agents [25h]	2025	4		R\$ 0,00	Projetos práticos de aplicações com LLMs
Ciência de Dados	DuckDB e Firecrawl Para Database e Web Scraping Analytics[8h]	2025	1	1	R\$ 0,00	Curso introdutório de ferramentas de extração de dados da web otimizados para LLMs utilizando banco de dados in-process local
Ciência de Dados	FastAPI - The Complete Course 2025 (Beginner + Advanced)	2025	1	1	R\$ 0,00	Visão geral do Framework para construção de API em python

		PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - 2025				
TEMA	CAPACITAÇÃO	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO	CUSTO	JUSTIFICATIVA
Gestão e Governança		2025	1	1	R\$ 0,00	Evolução em práticas de UX - Objetivo da DGTIC
Gestão e Governança		2025	1		R\$ 0,00	Evolução em métricas para produtos - Objetivo da DGTIC
Gestão e Governança		2025	1		R\$ 0,00	Evolução em gestão de produtos - Objetivo da DGTIC
Gestão e Governança		2025	1		R\$ 0,00	Evolução no trabalho envolvendo POs - Objetivo da DGTIC
Gestão e Governança		2025	2	1	R\$ 0,00	Evolução em gestão ágil e atuação como scrummaster - Objetivo da DGTIC
Gestão e Governança		2025	1		R\$ 0,00	Evolução em práticas de UX - Objetivo da DGTIC
Gestão e Governança		2025	1	1	R\$ 0,00	Envolvimento da DGTIC em projetos de IA
Gestão e Governança	Processo de Atendimento	Junho	10		R\$ 0,00	Divulgar boas práticas do processo de atendimento para o DAU. Usando o Manual de atendimento
Gestão e Governança	Treinamento CIT Smart	Junho	16		R\$ 0,00	Padronizar a forma de operação e o atendimento de chamados via CITSmart
Gestão e Governança	Capacitação no Sistema SCMP	Maio	7	7	R\$ 0,00	Capacitação organizada pelo CMP para utilização e gerenciamento do sistema SCMP. A participação da SETIC é importante tanto para facilitar o entendimento pelos desenvolvedores responsáveis por manter o sistema, quanto pela necessária capacitação dos subsetores da TI que utilizam o sistema para fins de movimentação patrimonial
Gestão e Governança	Ferramentas de IA para tarefas administrativas	Junho	2	1	R\$ 0,00	Utilização das novas tecnologias para potencializar o trabalho operacional administrativo, como elaboração de minutas de despachos, ofícios, atas de reunião, correção ortográfica, etc
Gestão e Governança	Treinamento PJE	Fevereiro	25	25	R\$ 0,00	Capacitação técnica a todos os envolvidos com atendimento atendimento do PJE

ID	OBJETO	PRIOR.	SITUAÇÃO	CONTRATADA	AÇÃO	VIGÊNCIA	PRORROGA ATÉ	VLR PERMANENTE	VLR CUSTEIO	VLR CONTINUADO	FONTE	CONTRATO	PROT. PRINCIPAL
1	Rede-JT - Capital Principal (Brisanet)	Cont		Brisanet	Vigente	25/02/26	25/02/26			R\$ 38.456,04	TRT13	06/2021	5793/2023
2	Rede-JT - Capital Redundante (Sitecnet)	Cont		SitecNet	Vigente	07/01/27	07/07/34			R\$ 22.680,00	TRT13	22/2024	1215/2024
3	Rede-JT - Interior Principal (Vogel)	Cont		Vogel	Vigente	10/03/26	10/03/26			R\$ 104.283,12	TRT13	07/2021	6059/2023
4	Rede-JT - Interior Redundante (Sitecnet)	Cont		SitecNet	Vigente	11/02/27	11/08/34			R\$ 83.100,00	TRT13	23/2024	1215/2024
5	Link de Internet - Principal (Brisanet)	Cont		Brisanet	Vigente	14/02/27	14/02/27			R\$ 10.078,92	TRT13	10/2022	4323/2024
6	Link de Internet - Redundante (1Telecom)	Cont		1Telecom	Vigente	17/02/27	17/02/27			R\$ 12.654,72	TRT13	11/2022	4461/2024
7	Sala-Cofre - Suporte e Manutenção	Cont		Green4T	Prorrogar	27/07/25	27/07/27			R\$ 466.745,11	TRT13	29/2022	3630/2025
8	PAM - Ger. Privilégio de Acesso	Cont		JAMC	Prorrogar	08/09/25	08/09/27			R\$ 232.102,30	TRT13	37/2022	3843/2025
9	Suporte Infra Ágil	Cont		Teltec	Prorrogar	23/11/25	23/11/26			R\$ 31.099,92	TRT13	31/2021	6348/2025
10	Oracle - Suporte	Cont		Oracle	Encerrar	24/11/25	24/11/25			R\$ 320.478,88	TRT13	32/2021	7504/2023
11	Postgre - Suporte	Cont		Tecnisys	Vigente	21/04/26	21/04/26			R\$ 108.360,84	TRT13	09/2021	8200/2023
12	Zoom - Audiências e Sessões	Cont		XP On	Prorrogar	18/02/25	18/02/26			R\$ 25.326,22	TRT13	05/2021	10971/2024
13	Zoom - EJud	Cont		XP On	Prorrogar	15/09/25	15/09/26			R\$ 690,36	TRT13	23/2021	3852/2025
14	Antivírus	Cont		ISH	Encerrar	08/08/25	08/08/25			R\$ 43.783,84	TRT13	19/2021	19251/2021
15	Risk Manager	Cont		Módulo	Vigente	31/05/27	31/05/27			R\$ 58.500,00	TRT13	11/2023	1330/2023
16	Certificados e-CNPJ e WildCard	Cont		Soluti	Prorrogar	26/06/25	26/06/27			R\$ 1.654,45	TRT13	24/2022	2475/2025
17	Power BI	Cont		WeltSolutions	Prorrogar	18/08/25	18/08/26			R\$ 4.008,72	TRT13	33/2022	4266/2025
18	Google Workspace	Cont		RJR/RW3	Encerrar	19/06/25	20/12/27			R\$ 187.198,82	TRT13	40/2022	25620/2021
19	Gerenciamento de Vulnerabilidades	Cont		ITProtect	Vigente	07/09/27	07/09/27			R\$ 120.000,00	TRT13	36/2022	28043/2021
20	CDN - Content Delivery Network	Cont		Claro	Prorrogar	08/12/25	08/12/27			R\$ 98.981,04	TRT13	43/2022	30851/2021
21	ITSM (CIT Smart)	Cont		Central IT	Vigente	17/03/26	17/09/28			R\$ 484.716,00	TRT13	38/2023	4217/2023
22	Extensão de garantia switches SAN	Cont		Hardlink	Vigente	04/03/27	04/09/29			R\$ 2.640,00	TRT13	32/2024	7053/2024
23	Solução de conscientização de segurança	Cont		Service IT	Vigente	12/11/26	12/11/34		R\$ 12.135,60	R\$ 0,00	TRT13	50/2024	482/2025
24	Ferramenta de Desenvolvimento (IntelliJ)	Cont		Cyber Wan	Encerrar	02/10/25	02/10/27			R\$ 0,00	TRT13	37/2023	2227/2023
25	Central de Serviços Terceirizada	Cont		Ilha Service	Vigente	16/01/26	16/07/28			R\$ 906.649,70	TRT13	28/2023	1725/2023
26	Ferram. Oficinas Inovação (Miro)	Cont		OP Tecnologia	Prorrogar	09/10/25	09/10/33			R\$ 6.800,00	TRT13	43/2023	6922/2024
27	Software Design CANVA	Cont		Ana Célia	Prorrogar	16/11/25	16/11/33			R\$ 3.375,00	TRT13	48/2023	7128/2024
28	Adobe Cloud	Cont		MCR	Vigente	22/04/27	22/04/27			R\$ 0,00	TRT13	11/2024	2166/2024
29	AutoCAD	Cont		MCR	Vigente	20/11/27	20/11/27			R\$ 0,00	TRT13	52/2024	7054/2024
30	Emissão de Certificados Digitais A3	Cont		Certisign	Vigente	12/09/29	12/09/34			R\$ 30.000,00	TRT13	34/2024	6577/2024
56	Firewall	Cont		NTSec	Vigente	16/04/26	16/04/26			R\$ 0,00	TRT13	10/2024	2703/2024

ID	OBJETO	PRIOR.	SITUAÇÃO	CONTRATADA	AÇÃO	VIGÊNCIA	PRORROGA ATÉ	VLR PERMANENTE	VLR CUSTEIO	VLR CONTINUADO	FONTE	CONTRATO	PROT. PRINCIPAL
57	Solução de backup (Bacula)	Cont		Heitor Medrado	Vigente	14/08/26	14/08/26			R\$ 0,00	TRT13	32/2022	25450/2021
58	Solução de controle de acesso às redes (NAC)	Cont		ISH	Vigente	26/07/27	26/07/27			R\$ 0,00	TRT13	28/2022	10653/2021
53	Google Workspace (TST)	1	Contrato Assinado	Xertica	Coparticip	19/06/27	19/06/29			R\$ 297.635,00	TRT13	15/2025	1888/2025
32	Oracle	1	Aguardando Prioridade		Compra direta					R\$ 38.233,33	TRT13		6287/2025
33	Suporte Servidores Blade	1	Concluído	Newsupri	Ata própria	24/02/29	24/02/33			R\$ 338.644,64	TRT13	10/2025	271/2025
39	Fibra apagada (JFPB)	1	Contrato Assinado	Inorpel	Coparticip	12/03/30	12/03/35			R\$ 16.000,00	TRT13	11/2025	9573/2024
34	Material de Consumo de TIC	1	Finalizando Estudos		Licitação				R\$ 15.000,00		TRT13		2630/2025
35	Solução de impressão	1	Tramitação Administrativa		Licitação					R\$ 50.000,00	TRT13		662/2025
36	Solução de prototipação de sistemas	1	Contrato Assinado	Maria Aparecida	Licitação	03/06/26	03/06/35			R\$ 3.840,00	TRT13	20/2025	639/2025
44	Solução Ataques Cibernéticos - XDR (TRT 2)	1	Contrato Assinado	Petaservice	Coparticip	11/06/27	11/06/35		R\$ 36.500,00	R\$ 710.185,36	TRT13	21/2025	2476/2025
40	Roteadores de Internet (TRT 3)	1	Contrato Assinado	NTT	Coparticip			R\$ 308.102,78	R\$ 39.145,66		TRT13	19/2025	8210/2023
41	Solução Wifi (TRT23)	1	Contrato Assinado	Lettel	Coparticip			R\$ 580.283,00	R\$ 27.500,00		TRT13		8062/2023
48	Servidor Rack com GPU	1	Contrato Assinado	Plugnet	Ata própria			R\$ 239.000,00			TRT13	13/2025	2299/2025
45	Notebooks	1	Iniciando Estudos		Coparticip			R\$ 49.050,00			TRT13		
55	Licenças de IA generativa	1	Iniciando Estudos		Licitação				R\$ 72.000,00		TRT13		4875/2025
59	Central de Serviços	1	Finalizando Estudos		Licitação					R\$ 0,00	TRT13		2736/2025
37	Solução de gestão de projetos / chamados	2	Aguardando Prioridade		Licitação				R\$ 36.000,00		TRT13		
50	Expansão storage	2	Aguardando Prioridade		Coparticip			R\$ 444.000,00			TRT13		563/2025
42	Switches Core	2	Aguardando coparticipação		Coparticip			R\$ 400.000,00			TRT13		
43	Switches LAN	2	Aguardando coparticipação		Coparticip			R\$ 450.000,00			TRT13		
46	Microcomputadores	2	Aguardando Prioridade		Coparticip			R\$ 945.000,00			CSJT		
47	Monitores	2	Aguardando Prioridade		Coparticip			R\$ 617.400,00			CSJT		
51	Solução de Gerenciamento de Dispositivos (TRT 4)	2	Aguardando coparticipação		Coparticip				R\$ 731.732,25	R\$ 88.378,14	TRT13		11454/2024
54	Mídias criptográficas para certificado digital (TRT 16)	2	Aguardando Prioridade	Globalsec	Coparticip				R\$ 7.400,00		TRT13		6771/2024
49	Monitoramento AD (TRT 9)	3	Aguardando coparticipação		Coparticip				R\$ 348.201,45	R\$ 21.204,96	TRT13		9738/2024
52	Roteadores de link de dados	3	Aguardando Prioridade		Ata própria			R\$ 22.740,00			TRT13		2259/2024

NATUREZA	PROGRAMADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO/EMPENHADO	EMPENHADO/PROGRAMADO	LIQUIDADO/PROGRAMADO
CONTINUADO	R\$ 3.404.364,00	R\$ 3.130.555,64	R\$ 1.337.919,81	42,74%	91,96%	39,30%
CUSTEIO	R\$ 1.644.683,99	R\$ 1.402.805,00	R\$ 108.772,14	7,75%	85,29%	6,61%
PERMANENTE	R\$ 1.176.435,78	R\$ 1.194.031,44	R\$ 0,00	0,00%	101,50%	0,00%
CUSTEIO E CONTINUADO	R\$ 5.049.047,99	R\$ 4.533.360,64	R\$ 1.446.691,95	31,91%	89,79%	28,65%
TOTAL	R\$ 6.225.483,77	R\$ 5.727.392,08	R\$ 1.446.691,95	25,26%	92,00%	23,24%
